

Comuni di Prata C. e San Giacomo F.
Provincia di Sondrio

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 17/10/2019

OGGETTO: REALIZZAZIONE VASCHE FISSE PER A.I.B. IN LOC. PRATELLA
DI PRATA CAMPORTACCIO E IN LOC. DALO' DI SAN GIACOMO
FILIPPO

COMMITTENTE: Comunità Montana della Valchiavenna

IMPRESA: COSTRUZIONI MOVITER Srl - Cava Dè Tirreni (SA), Via Raffaele
Baldi n.29 - C.F. e P.IVA 03688370653



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	<u>LAVORI A MISURA</u>				
1 019b	<i>Impianto di cantiere loc. Dalo'</i> Impianto di cantiere compreso formazione di pista sterrata di accesso realizzata con la formazione di rampa con materiale di riporto e scogliera a secco di sostegno, sia per l'accesso al serbatoio che alla vasca di carico, spazi di manovra temporanei in corrispondenza del cantiere con utilizzo del materiale proveniente dallo scavo, formazione di piazzole per accatastamento provvisorio materiale di scavo e ripristino dell'area di cantiere a lavori ultimati	a corpo	1,00	1'279,40	1'279,40
2 020	<i>Demolizione di eventuali trovanti con sistemazione nell'area di cantiere</i> Demolizione di eventuali trovanti dimensioni > 1 mc con mezzo meccanico o a mano compreso trasporto e sistemazione nell'area di cantiere	m3	33,49	28,00	937,72
3 022	<i>Scavo di sbancamento di terreno di qualsiasi natura esegu ... scarica (oneri compresi) di eventuale materiale di risulta</i> Scavo di sbancamento di terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico anche di piccole dimensioni, accatastamento e successivo reinterro a tergo del manufatto e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, escluso solo la demolizione di eventuali trovanti di dimensione > 1 mc, decespugliamento compreso carico, trasporto e smaltimento in discarica (oneri compresi) di eventuale materiale di risulta	m3	438,00	10,00	4'380,00
4 023	<i>Ghiaione</i> Fornitura e stesa di ghiaione drenante sotto le fondazione e di rinfiaccio ai muri, compreso eventuale trasporto con dumper	m3	28,50	90,00	2'565,00
5 024	<i>Magrone per sottofondazione</i> Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di qualsiasi entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso casseforme con il seguente dosaggio 200 kg/m³ - Spessore 10 cm	m3	13,05	165,00	2'153,25
6 025	<i>Calcestruzzo per fondazioni C25/30 - Serbatoio</i> Fornitura e posa di calcestruzzo per fondazioni armate plinti, platee, basamenti ecc. gettato con l'impiego di casseri. Resistenza caratteristica (a 28 gg di stagionatura: 20° C, 90% U.R.) C25/30 Rck= 30 Mpa. Classe di esposizione XC2. Compreso aggiunta di additivo impermeabilizzante. Rapporto acqua cemento (in peso) A/C= 0,6. - Diametro massimo inerti = 25 mm - Consistenza: abbassamento cono di Abrams > 16 cm (S4). Il calcestruzzo dovrà essere perfettamente lavorabile in cantiere fino alla vibratura. Compreso additivi che ne ritardino la presa a seconda delle tempistiche richieste dal trasporto e dalla movimentazione e posa in cantiere. Compreso vibratura, acciaio B450C incidenza 95 Kg/mc e casseri. (Incidenza compreso riprese). Compreso tutto quanto l'occorrente per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Calcestruzzo prodotto da impianto di betonaggio certificato	m3	38,02	315,00	11'976,30
7 026	<i>Calcestruzzo elevazioni C25/30 - Serbatoio</i> Fornitura e posa di calcestruzzo per elevazioni spessore 25 cm e altezza fino a 5 metri gettato con l'impiego di casseri - detrarre aperture sup > 1 mq. Resistenza caratteristica (a 28 gg di stagionatura: 20° C, 90% U.R.) C25/30 Rck= 30 Mpa. Classe di esposizione XC2. Compreso aggiunta di additivo impermeabilizzante.				
	A R I P O R T A R E				23'291,67


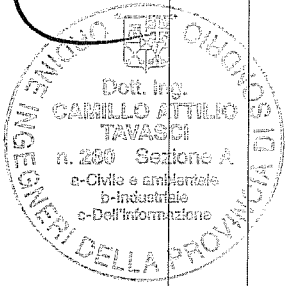

COMMITTENTE: Comunità Montana della Valchiavenna
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 17/10/2019

COMUNITA' MONTANA
DELLA VALCHIAVENNA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Alberto Bianchi)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				23'291,67
8 030	Rapporto acqua cemento (in peso) A/C= 0,6. - Diametro massimo inerti = 25 mm - Consistenza: abbassamento cono di Abrams >16 cm (S4). Il calcestruzzo dovrà essere perfettamente lavorabile in cantiere fino alla vibratura. Compreso additivi che ne ritardino la presa a seconda delle tempistiche richieste dal trasporto e dalla movimentazione e posa in cantiere. Compreso sigillatura fori pannelloni mediante malta cementizia espansiva, vibratura, acciaio B450C incidenza 96 Kg/mc, casseri e la formazione di setti antisismici. Compreso tutto quanto l'occorrente per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Calcestruzzo prodotto da impianto di betonaggio certificato SOMMANO...	m3	14,44	488,00	7'046,72
	Calcestruzzo per fondazioni C32/40 - Vasca carico elicottero Fornitura e posa di calcestruzzo per fondazioni armate plinti, platee, basamenti ecc. gettato con l'impiego di casseri. Resistenza caratteristica (a 28 gg di stagionatura: 20° C, 90% U.R.) C32/40 Rck= 40 Mpa. Classe di esposizione XF3 con additivo aerante. Compreso aggiunta di additivo impermeabilizzante. Rapporto acqua cemento (in peso) A/C= 0,5. - Diametro massimo inerti = 25 mm - Consistenza: abbassamento cono di Abrams >16 cm (S4). Il calcestruzzo dovrà essere perfettamente lavorabile in cantiere fino alla vibratura. Compreso additivi che ne ritardino la presa a seconda delle tempistiche richieste dal trasporto e dalla movimentazione e posa in cantiere. Compreso vibratura, acciaio B450C incidenza 140 Kg/mc e casseri. (Incidenza compreso riprese). Compreso tutto quanto l'occorrente per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Calcestruzzo prodotto da impianto di betonaggio certificato SOMMANO...	m3	5,81	395,00	2'294,95
9 031	Calcestruzzo elevazioni C32/40 - Vasca carico elicottero Fornitura e posa di calcestruzzo per elevazioni spessore 25 cm e altezza fino a 5 metri gettato con l'impiego di casseri. Resistenza caratteristica (a 28 gg di stagionatura: 20° C, 90% U.R.) C32/40 Rck= 40 Mpa. Classe di esposizione XF3 con aerante. Compreso aggiunta di additivo impermeabilizzante. Rapporto acqua cemento (in peso) A/C= 0,5. - Diametro massimo inerti = 25 mm - Consistenza: abbassamento cono di Abrams >16 cm (S4). Il calcestruzzo dovrà essere perfettamente lavorabile in cantiere fino alla vibratura. Compreso additivi che ne ritardino la presa a seconda delle tempistiche richieste dal trasporto e dalla movimentazione e posa in cantiere. Compreso sigillatura fori pannelloni mediante malta cementizia espansiva, vibratura, acciaio B450C incidenza 65 Kg/mc, casseri e la formazione di setti antisismici. Compreso tutto quanto l'occorrente per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Calcestruzzo prodotto da impianto di betonaggio certificato SOMMANO...	m3	9,38	475,00	4'455,50
	Parziale LAVORI A MISURA euro				37'088,84
	RIBASSO del 15,125% da considerare su euro				37'088,84
	TOTALE euro				37'088,84
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE: Comunità Montana della Valchiavenna
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 17/10/2019

COMUNITA' MONTANA
DELLA VALCHIAVENNA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Alberto Bianchi)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				
	<u>RIEPILOGO FINALE</u> <i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> LAVORI A MISURA euro RIBASSO del 15,125% da applicare su euro 37'088,84 = euro PER LAVORI A MISURA euro TOTALE euro Gordona, 17/10/2019  COSTRUZIONI MOVITER S.r.l. L'Amministratore Unico <i>Marcantonio Amato</i> Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Camillo Attilio Tavasci   COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Ing. Alberto Bianchi) 			37'088,84 -5'609,69 31'479,15 31'479,15	
	A RIPORTARE				

COMMITTENTE: Comunità Montana della Valchiavenna
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 17/10/2019

COSTO DELLA SICUREZZA – 1° SAL – MISURE DEFINITIVE al 17/10/2019

- | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|
| - | Recinzioni provvisorie + ingressi | | |
| - | Dalò | <u>ml 140</u> | |
| | | ml 140 x €/ml 4,00 | € 560,00 |
| - | Ponteggio a mensola con parapetti e piano di lavoro per
getto murature e protezione solette | | |
| | - <i>ponteggio vasca carico Dalò</i> | | |
| | m 3,5+3,5+3,0+3,0 = m 13 | | |
| | - <i>ponteggio muri serbatoio Dalò</i> | | |
| | m 2,5+8,5+5,5 = m 16,5 | | |
| | Totale m 29,5 x €/ml 15,00 = | | € <u>442,50</u> |
| | TOTALE 1° SAL al 17/10/2019 | | € 1.002,50 |

Gordona, 17/10/2019

Il Tecnico

Dott. Ing.
 CARILLO ATTILIO
 TAVASCI
 n. 200 Sezione A
 a-Civile e ambientale
 b-Industriale
 c-Dell'edilizia

L'Impresa
COSTRUZIONI MOVITER S.r.l.
L'Amministratore Unico
Marcantonio Amato

COMUNITA' MONTANA
DELLA VALCHIAVENNA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Alberto Bianchi)

ITA' MONTE
VALCHIAVER
BILE DEL PROCEDIN
Alberto Bianchi
