
ID	Task Name	Duration
1	**Realizzazione di un vallo paramassi in Comune di Novate Mezzola**	135 days
2	**A Allestimento cantiere ed approvvigionamento materiali**	**36 days**
3	A.1 - Installazione della recinzione e preparazione dell'area di cantiere	3 days
4	A.2 - Decespugliamento e taglio piante	30 days
5	A.3 - Rilievo topografico e tracciamento delle opere	5 days
6	**B Attività preliminari e realizzazione Rilevato in terra rinforzata**	**122 days**
7	B.1 - Approvvigionamento geogriglie di rinforzo per terre rinforzate	60 days
8	B.2 - Installazione dell'impianto di frantumazione e vagliatura - Approvvigionamento delle terre per la realizzazione del rilevato e dei rinterri	35 days
9	B.3 - Realizzazione nuovo fosso irriguo	45 days
10	B.4 - Attività di scotico e scavi di sbancamento	40 days
11	B.5 - Realizzazione scogliera e pista di manutenzione	70 days
12	B.6 - Realizzazione Rilevato in terra rinforzata	105 days
13	B.7 - Realizzazione Strada comunale asfaltata	30 days
14	B.8 - Realizzazione Strada comunale bianca	**40 days**
15	**C Installazione barriere metalliche ad elevata deformabilità**	**80 days**
16	C.1 - Esecuzione ancoraggi di prova (esecuzione e prova di sfilamento)	4 days
17	C.2 - Ancoraggi definitivi	15 days
18	C.3 - Collaudo ancoraggi	5 days
19	C.4 - Installazione barriere paramassi	15 days
20	**D Sistemazioni finali e ripristini**	**115 days**
21	D.1 - Fornitura di specie arbustive	5 days
22	D.2 - Idrosemina	15 days
23	D.3 - Messa a dimora di specie arbustive	60 days
24	D.4 - Ripristini finali e smobilizzo cantiere	3 days



Le attività di indagini e prove e di smaltimento sono distribuite durante l'esecuzione dei lavori sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e delle esigenze dell'impresa

REALIZZAZIONE DI UN VALLO PARAMASSI A DIFESA DELL'ABITATO IN COMUNE DI NOVATE MEZZOLA
CIG 9158198A3

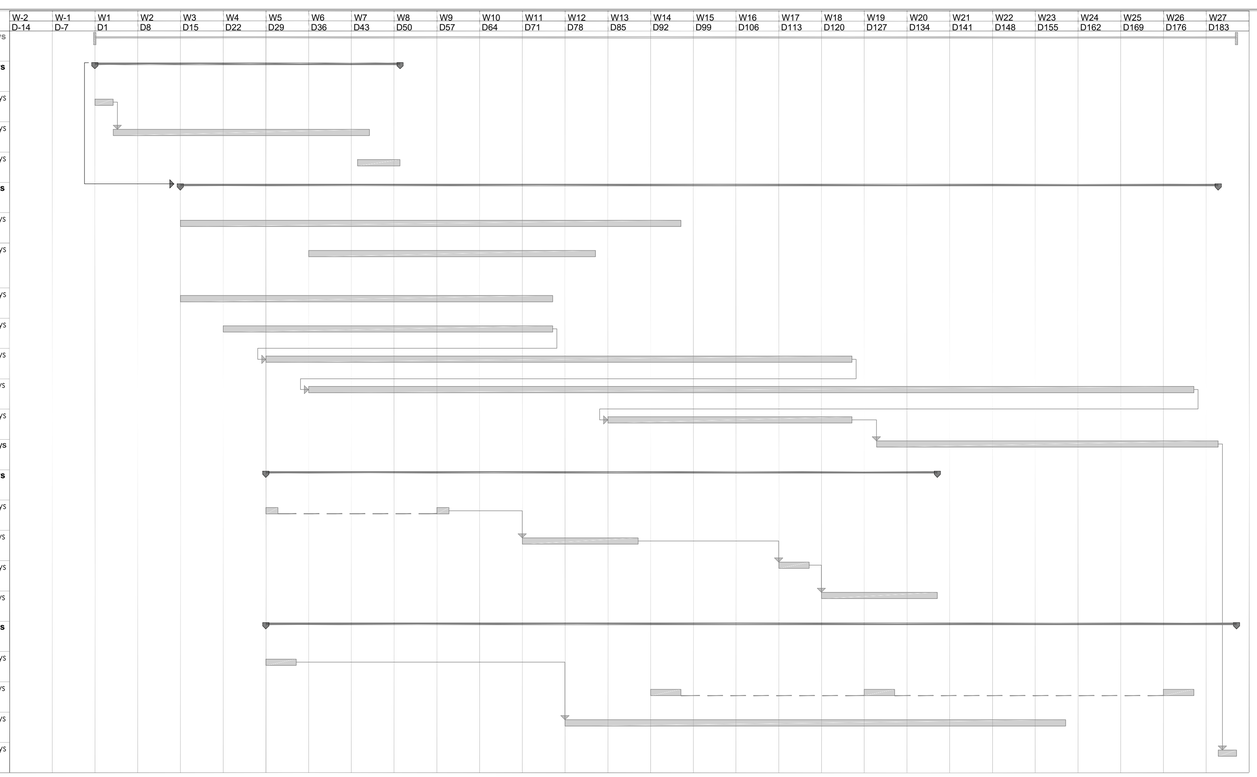

Fase Progettuale

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto

05 - CANTIERIZZAZIONE
Cronoprogramma

Ing. P. Cancelli
Ing. G. Bragonzi

STUDIO ANGELI ASSOCIATO

Dott. Geol. A. Tamburini

IMAGE

Collaborazione

Ing. A. Mocchi
Ing. L. Tedeschi

Dott. Agr. F. Neonato
(PN Studio)

Elaborato

05.02

Codice 294E021D09

Scala -

13/12/2024	0	Emissione per consegna	GB
Data	n°	Descrizione	Approvato
